ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2433
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO


ATENDIÓ:				**REPORTÓ:**	
EQT:	23	**MOVIL:**	3	COBB	
FECHA:	08-05-05	**HORA:**	10:40 a.m.		
DIRECCIÓN:	Kr. 5 #51-06 Sur			**ÁREA DIRECTA:**	45 m²
BARRIO:	La Paz Sector Cebadal			**POBLACIÓN ATENDIDA:**	
UPZ:	55 – Diana turbay			FAMILIAS 2	ADULTOS 04 NIÑOS 02
LOCALIDAD:	Rafael Uribe			PREDIOS EVALUADOS 1	

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Dos deslizamientos puntuales que involucran en total aproximadamente 3 m³ de material de relleno, en la corona de un talud de aproximadamente 30 m de altura por 200 m de longitud. Los deslizamientos ocurrieron el viernes 06 de Mayo/05 y de acuerdo con lo observado en el sitio fueron causados por las lluvias del Jueves 05 de Mayo/05. No se observa ninguna vivienda comprometida.

3 ESQUEMA

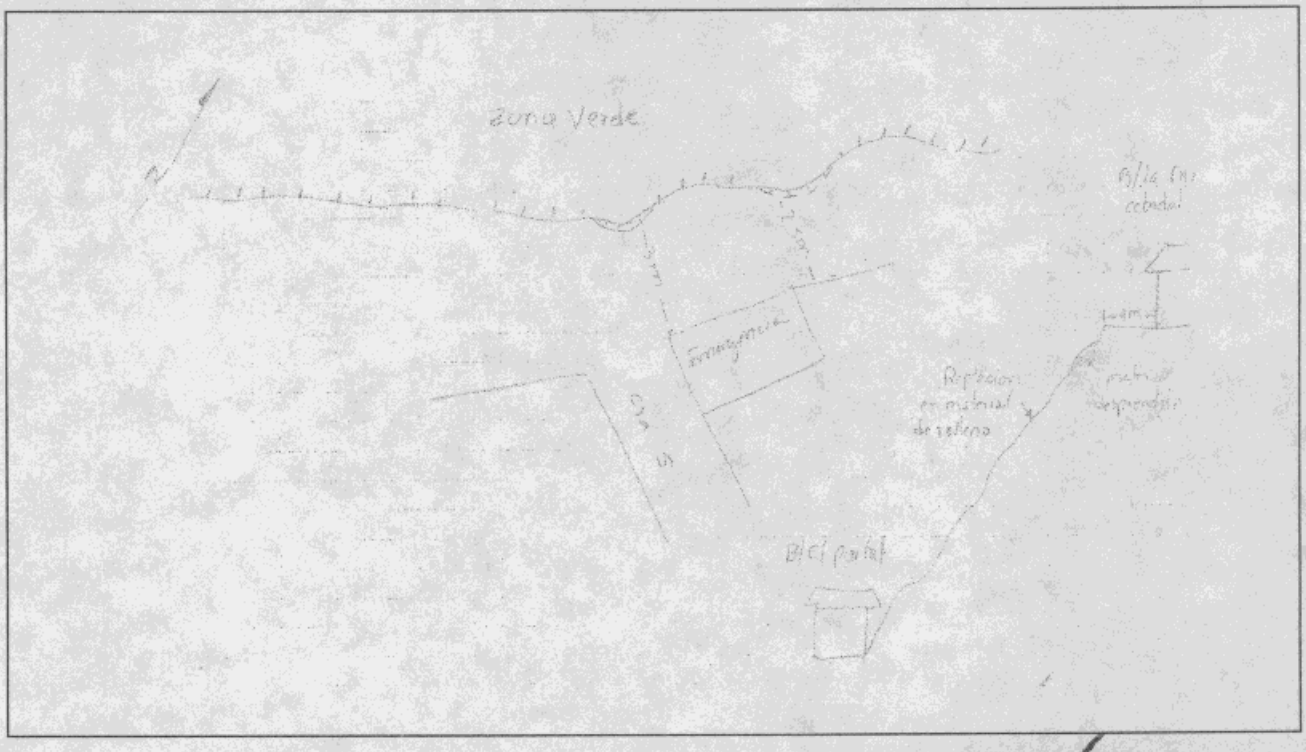

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N
1	Martha Milena Retavisca	Kr. 5 #51-06 Sur	5692166	6	4	2
2						
3						
4						

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

A largo plazo podría verse afectada alguna vivienda, tanto de la parte alta (Barrio La Paz- Cebadal) como de la parte baja del talud (Barrio El Portal), ya que el talud es muy susceptible a los fenómenos de remoción en masa y las aguas lluvias podrían detonarlos.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS HUMANITARIAS
	SI	NO	DEF.	TEMP.	
1		X			No.
2					
3					
4					

7 ACCIONES ADELANTADAS:

Se realizó una evaluación de la vivienda y a lo largo del talud.

8 RECOMENDACIONES

Es necesario retirar el material suelto y realizar un manejo adecuado de las aguas lluvias en dicho talud, para evitar que se continúe deteriorando y que en el futuro se presenten movimientos de mayor magnitud que involucren viviendas tanto del barrio La Paz Sector Cebadal como del barrio El Portal.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: PILAR DEL ROCIO GARCIA G.
PROFESIÓN: GEÓLOGA
MATRICULA: 1539 C.P.G.

Elaboró

NOMBRE: CARLOS EDUARDO MOTTA T.
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN)- MSc INGENIERÍA-GEOTECNIA (UN)
MATRICULA 25202-73855 CND

Revisó

Vo. Bo.: ING. DIANA PATRICIA AREVALO
COORDINADORA TECNICA

Vo.Bo. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR (E)
