Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1438
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS


Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT 7	Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:


Fecha	:	Abril 29 de 2002
Hora	:	5 : 30 pm
Dirección	:	Diagonal 55 Sur # 5A - 08
Barrio	:	La Paz Sector La Malla
Localidad	:	Rafael Uribe (18)
Área directa	:	0.05 ha

1.0 Descripción General

En la zona se presentó un deslizamiento puntual de suelo desde un talud vertical de 3.5 m de altura, afectando la vivienda del Señor Víctor Manuel Rodríguez.

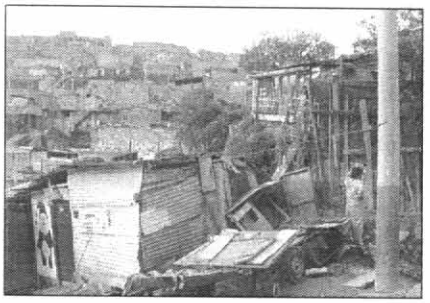

La vivienda de la parte baja del talud está construida en material de recuperación, por lo cual el material deslizado aplastó uno de los muros. La vivienda de la parte superior del talud (según los vecinos no es habitada regularmente) se desarrolla hacia el oriente, pero en el borde del escarpe existe un cerramiento en tablas y estructuras metálicas (rejas de ventanas) que quedaron sin soporte por efecto de la remoción del terreno.

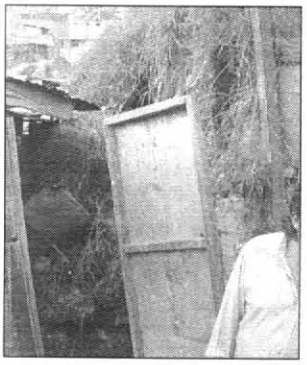

Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

2.0 Evaluación de daños
Los daños en la vivienda del Señor Manuel Rodríguez fueron en parte del muro que limita con el talud, y perdida de algunos utensilios de cocina.

3.0 Recomendaciones
Se recomendó la evacuación transitoria de la parte sur de la vivienda mientras se construye un sistema de contención de común acuerdo entre los propietarios de los dos predios involucrados, y retirar el cerramiento en tablas y estructuras metálicas de la vivienda de la parte alta.

Advertencia:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
O.K **COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS**
