ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. 107

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2065

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	5	Bomberos
FECHA:	Junio 23 de 2004	HORA:	1:30 PM	

DIRECCIÓN:	Dg. 82A Sur No. 8B – 68 Este	ÁREA DIRECTA:	72 m²				
BARRIO:	San Isidro	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	57 – Gran Yomasa	FAMILIAS	1	ADULTOS	1	NIÑOS	3
LOCALIDAD:	5 – Usme						


2 EVENTO

TIPO:	REMOCIÓN EN MASA		INUNDACIÓN		ESTRUCTURAL	
		X				X

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:


Reactivación del deslizamiento ocurrido en tres ocasiones anteriores en el corte efectuado en el extremo norte del predio para la adecuación del terreno para la construcción de la vivienda. El evento actual consistió en el desprendimiento de dos (2) bloques de suelo; de los cuales uno se recostó contra la vivienda.

3 ESQUEMA

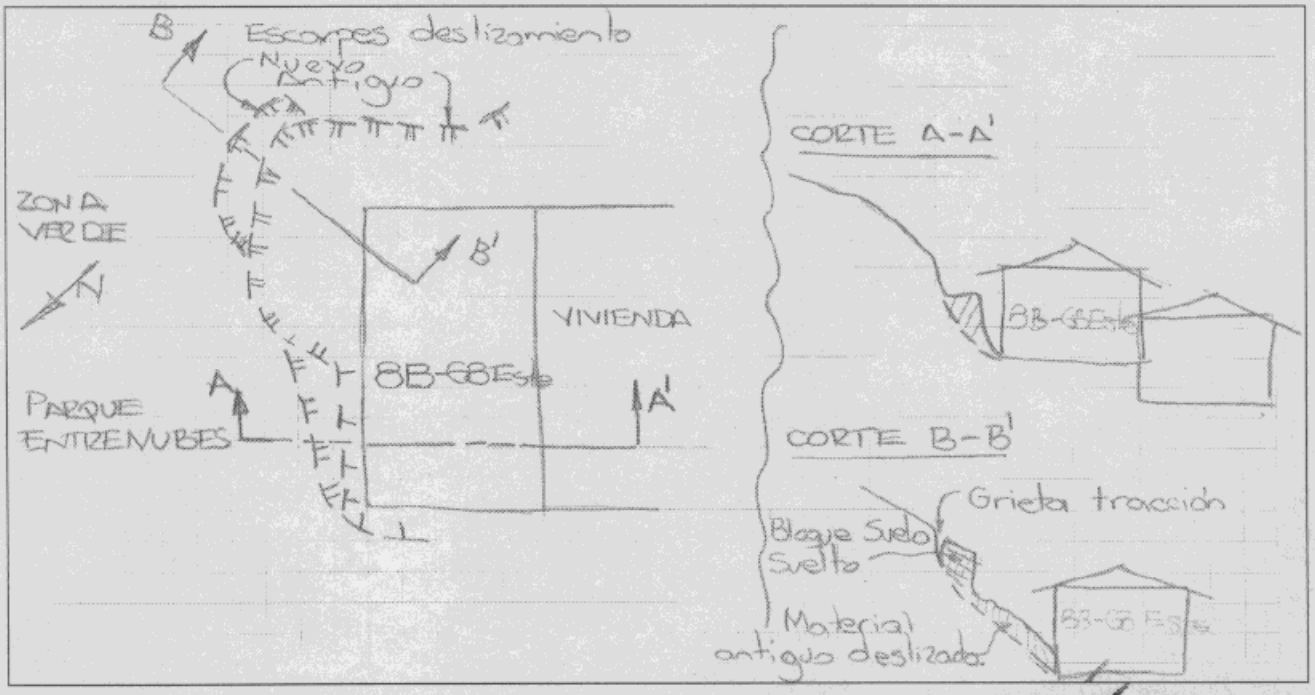




Fotografía 1. Se observa como el material que se ha deslizado se encuentra depositado contra el muro norte de la vivienda.

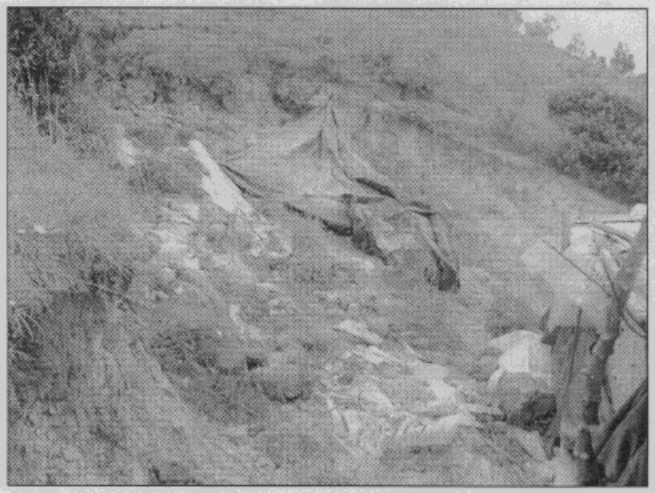

Fotografía 2. Panorámica del deslizamiento desde la parte inferior-.



Fotografía 3. Bloque de suelo que se desprendió en la pata del deslizamiento.

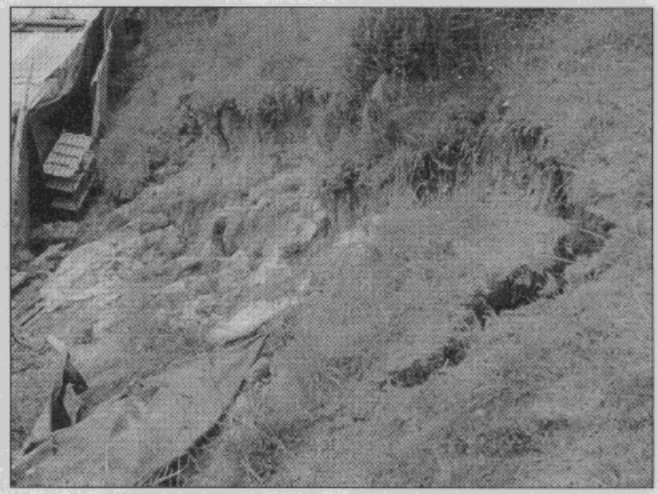

Fotografía 4. Bloque que se desprendió en la corona del deslizamiento.

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ceneida Niño	Dg. 82A Sur No. 8B – 68 Este	7640911	4	1	3	Por lo observado exteriormente, ninguno.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso del muro norte de la construcción por los empujes generados contra éste por el material deslizado.
- Constante humedad en el costado norte de la vivienda.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X				X		NO	NO

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Se recomendó a la señora Niño retirar los objetos ubicados en el costado sur de la construcción
- Se confirmó via radio que la familia de la señora Niño fue incluida con prioridad uno (1) en el proyecto de reasentamientos mediante el Diagnóstico Técnico de Emergencia No. DI-1888 del 12 de diciembre de 2003, por encontrarse en una situación de riesgo no mitigable.

8 RECOMENDACIONES

- Evacuar definitivamente la familia de la señora Niño, para lo cual se solicita presencia de personal social de la DPAE a fin de acompañar a la familia en este proceso.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÉCNICO

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co
