ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2152
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ	
EQT:	8	MOVIL:			
FECHA VISITA:	26-10-2004	HORA:	10:00 AM	FECHA EVENTO: 24-10-2004	HORA: 3:30 PM

DIRECCIÓN:	Calle 93B Sur # 3B - 80	ÁREA DIRECTA:	600 m²				
BARRIO:	Monteblanco	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	58 Comuneros	FAMILIAS	4	ADULTOS	19	NIÑOS	17
LOCALIDAD:	5 Usme	PREDIOS EVALUADOS	4				


2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:


Inundación de cuatro viviendas adyacentes al cauce de la quebrada Yomasa, producto de las intensas lluvias que aumentaron el caudal de la quebrada, así como por el taponamiento del cauce por basuras.

3 ESQUEMA

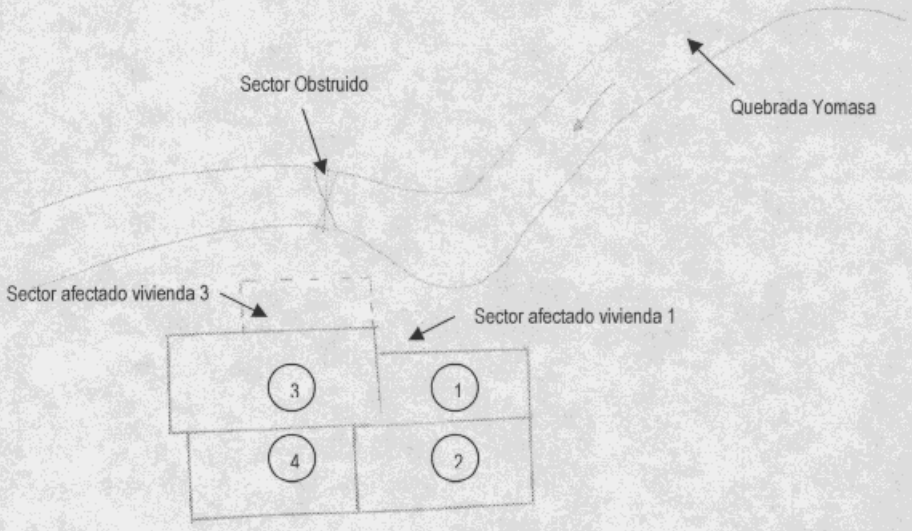

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

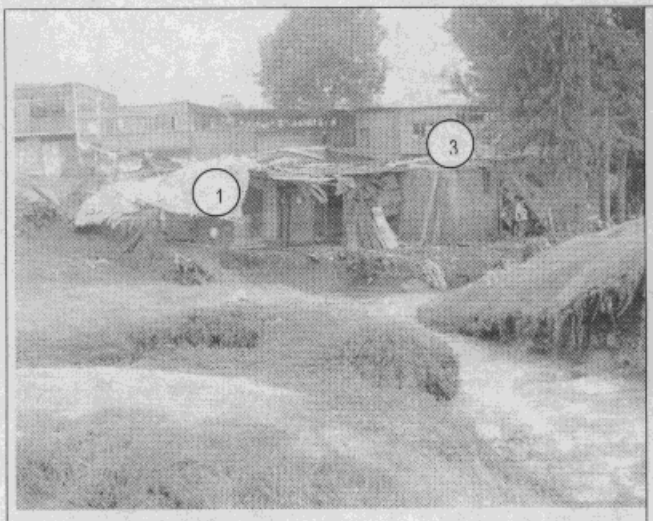

Fotografía 1. Vista General de la Zona Afectada. Se precian las viviendas 1 y 3 propiedad de los señores José Antonio Niño, Jairo Giraldo respectivamente.



Fotografía 2. Sector aledaño a la vivienda 3 en donde se observa parte de las basuras que obstruyeron el cauce de la quebrada.

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	José Antonio Niño	Carrera 3B #93A-51 Sur	7664315	6	5	3	Vivienda en Material de recuperación, se presentaron daños en la cocina y el baño, así como pérdida de enseres por la inundación.
2	Jorge Alberto Niño	Carrera 3B #93A-51 Sur	2002924	4	2	2	Vivienda en Material de recuperación, se mojaron los enseres.
3	Jairo Giraldo (Dueño), Ricardo Sánchez Sáenz (Arrendatario)	Calle 93B Sur # 3B-80		18	10	8	Vivienda en mampostería y cubierta en teja de asbesto cemento, en el costado que limita con la quebrada Yomasa se presentó el colapso de la estructura en lámina de zinc. La vivienda en mampostería presenta grietas asociadas al proceso constructivo.
4	Carlos Arturo Niño	Carrera 3B #93A-51 Sur		6	2	4	Vivienda en Material de recuperación, se mojaron los enseres.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Línea Telefónica

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Se pueden presentar nuevas inundaciones en las viviendas debido a que las familias se encuentran asentadas muy cerca del cauce de la quebrada Yomasa.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X				
2	X			X				
3	X			X				
4	X			X				

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección estructural a las cuatro viviendas para establecer el grado de habitabilidad.

8 RECOMENDACIONES

- Limpieza del cauce de la quebrada por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- Solicitar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá información sobre proyectos en la quebrada Yomasa, y si dentro de estos se adelantan programas de reasentamiento, que involucren los predios objeto del presente informe.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORO

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTENCIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

Diana Arévalo
REVISO

Vo. Bo.: **ING. JAVIER PAVA SANCHEZ**
COORDINADOR TECNICO
