DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2614
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:				**REPORTÓ:**	
EQT:	27	**MOVIL:**	8	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, COBB	
FECHA:	5-12-2005	**HORA:**	7:05 p.m.		

DIRECCIÓN:	Carrera 2 No. 42-05 Sur	**ÁREA DIRECTA:**	30 m²				
BARRIO:	Malvinas	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					
UPZ:	50 La Gloria	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	2	**NIÑOS**	1
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS**	1				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Desprendimiento del material superficial de un talud de corte de aproximadamente 4.0m de altura y pendiente fuerte debido por la saturación de los materiales que conforman el corte, generada por la intensas lluivas registradas en el sector, así como por la ausencia de medidas de protección y/o manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales. El movimiento no generó daños o afectación en la vivienda con nomenclatura Carrera 2 No. 42-05 Sur y ubicada en la parte superior del corte. El material deslizado tiene un volumen aproximado de 12.0m³ y se acumuló en la base del talud sin generar afectación alguna (Ver Figura 1).

3 ESQUEMA

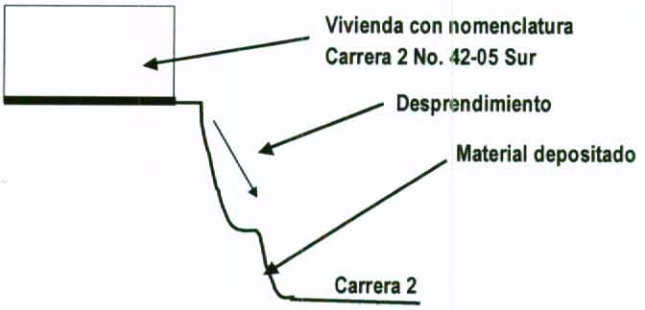

Figura 1 Esquema de la situación de emergencia generada en el talud de corte cercano al predio ubicado en la Carrera 2 No. 42-05 Sur del Barrio Malvinas de la Localidad de San Cristóbal

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Mauricio Pira	Carrera 2 No. 42-05 Sur	-	3	2	1	Ninguno

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Generación de nuevos deslizamientos en el camino peatonal, debido a la ausencia de medidas de protección, estabilización y drenaje del mismo.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			Ninguna	Ninguna

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual del desprendimiento y evaluación cualitativa de daños y condiciones de estabilidad y habitabilidad de la vivienda.
- Solicitud a través de la Red Distrital de Emergencias del apoyo para el retiro del material desprendido.

8 RECOMENDACIONES

- Adelantar el retiro del material.
- Implementar por parte de los propietarios del predio ubicado en la Carrera 2 No. 42-05 Sur, acciones para el seguimiento del comportamiento del talud e informar a la Dirección de Prevención y Atención de emergencias, DPAE, cualquier cambio significativo en las condiciones del mismo, con el objeto de realizar una nueva evaluación y definir las acciones a adelantar de ser el caso.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE PABLO ANTONIO GARZÓN CASARES
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202086145 CND

Elaboró

NOMBRE DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ
JEFE DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONCEPTOS

Revisó

Vo. Bo. **ING. GUILLERMO AVILA**
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Vo. Bo. **ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS**
DIRECTOR
