Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1631

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 5, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 262

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Noviembre 9 de 2002
Hora:	8:50 A.M.
Dirección :	Calle 75 Bis Sur # 20-39
Barrio:	**TIERRA LINDA**
UPZ:	67
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
En el corte realizado para la adecuación de los predios de la señora Alba Ortega y Luis Beltrán, se presentó un deslizamiento rotacional de aproximadamente 7 metros de material, predominando el relleno, parcialmente saturado.

La vivienda de la calle 75Bis Sur # 20-39 del barrio Tierra Linda, que colinda por el oeste con un lote vacío de propiedad del señor Luis Beltrán, presentó una afectación por el deslizamiento local que consistió en el colapso parcial del muro de cerramiento del patio.

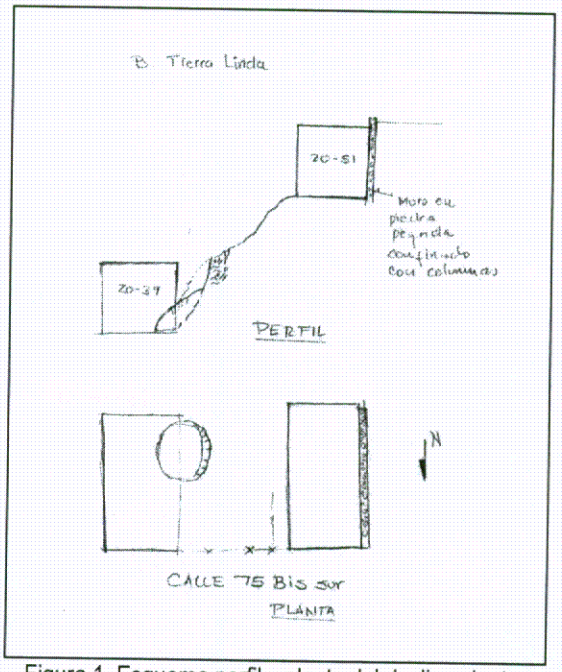


Figura 1. Esquema perfil y planta del deslizamiento.

El talud, donde se localiza la vivienda de la señora Alba Ortega, presenta pendiente entre moderada y fuerte.

BOGOTÁ PARA VIVIR

Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Personas e infraestructura afectadas:
Muro de cerramiento de la vivienda localizada en la Calle 75 Bis Sur No. 20-39, propiedad de la señora Alba Ortega.

Acciones Adelantadas:
Se solicitaron y entregaron 10 postes de sección rectangular en madera de 3 metros de longitud, para hincarlos en el terreno y confinar el corte, mientras se construye un muro por parte del propietario.

Acciones Pendientes:
Retiro del material deslizado que invade el patio de la vivienda.

RECOMENDACIONES:

- Construcción de un muro de contención para el confinamiento del corte, por parte del propietario.
- Construcción de un canal de drenaje para disminuir el sobrepeso del material contra los muros de la vivienda.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos
