ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1819


Atienden La Emergencia:
DPAE: CLE4, MOVIL 9, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 197 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita:	Octubre 27 de 2003
Dirección:	Diagonal 40 Sur # 2K – 73
	Calle 41B Sur # 2B – 15 / 21
Barrio:	**MALVINAS**
Localidad:	**San Cristóbal**
UPZ:	**50, La Gloria**

Descripción del Evento:
Debido a las lluvias que se presentaron en el sector entre la tarde del domingo 26 de octubre y la madrugada del lunes 27 se generó un deslizamiento local de aproximadamente 2 metros cúbicos entre las viviendas de los señores Luz Mery Muñoz y Eliseo Simbaqueva (teléfono 5668555). El material deslizado cayó contra la vivienda del señor Simbaqueva ocasionando el empuje de la estructura de la misma.

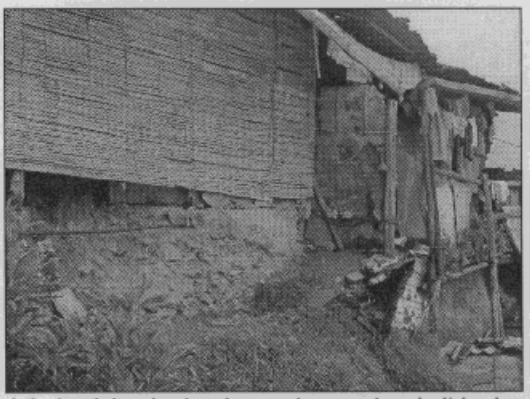

Fotografía 1. Costado oriental de la vivienda donde se observa la pérdida de material de cimentación.

La vivienda del señor Simbaqueva corresponde a una construcción informal en material de recuperación, emplazada en corte – relleno.

Las condiciones precarias de la zona han permitido la infiltración de agua en el terreno generando la pérdida de material en la cimentación de la vivienda como se muestra en la Fotografía No. 1.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Asimismo, entre los predios de la calle 41 B Sur entre los números 2B – 15 y 2B – 21, propiedad de los señores Pedro Pablo Salazar y Jairo López, respectivamente, se presentó un deslizamiento de tierras de aproximadamente 3 metros cúbicos que invadió el predio del señor Salazar.

Personas e infraestructura afectadas:
La vivienda del señor Simbaqueva donde habitan 4 menores y 2 adultos, hacia donde se deslizó el material
Las viviendas de las señoras Orfa Nelly Mejía y Luz Mery Muñoz se afectaron por encharcamiento.

El material del segundo deslizamiento quedó dentro de la vivienda del señor Pedro Pablo Salazar, afectando parcialmente su habitabilidad.

Acciones Adelantadas:
Evacuación de la familia del señor Simbaqueva al salón comunal del barrio Malvinas.
Entrega de ayudas humanitarias a las tres familias afectadas.

RECOMENDACIONES:
Cambiar a Prioridad 1 el trámite de reubicación de la familia del señor Eliseo Simbaqueva, incluido en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo mediante el Concepto Técnico No. 3799 de 2002, el cual fue evacuado de su vivienda.

Cambiar a Prioridad 1 los procesos de los señores Orfa Nelly Mejía, Luz Mery López, Pedro Pablo Salazar y Jairo López en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co
