ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. 192

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2012

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	2	COBB
FECHA:	Mayo 18 de 2004	HORA:	11:30 AM	


DIRECCIÓN:	Diagonal 46A Sur No. 10F – 24	ÁREA DIRECTA:	144 m²				
BARRIO:	Mirador del Sur I y II	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	54 – Marruecos	FAMILIAS	1	ADULTOS	3	NIÑOS	2
LOCALIDAD:	18 – Rafael Uribe Uribe						

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Colapso muros de contención y cerramiento del costado sur de la vivienda, a raiz de las deficiencias constructivas de estos elementos y a los trabajos de adecuación del terreno del predio vecino para construcción.

3 ESQUEMA

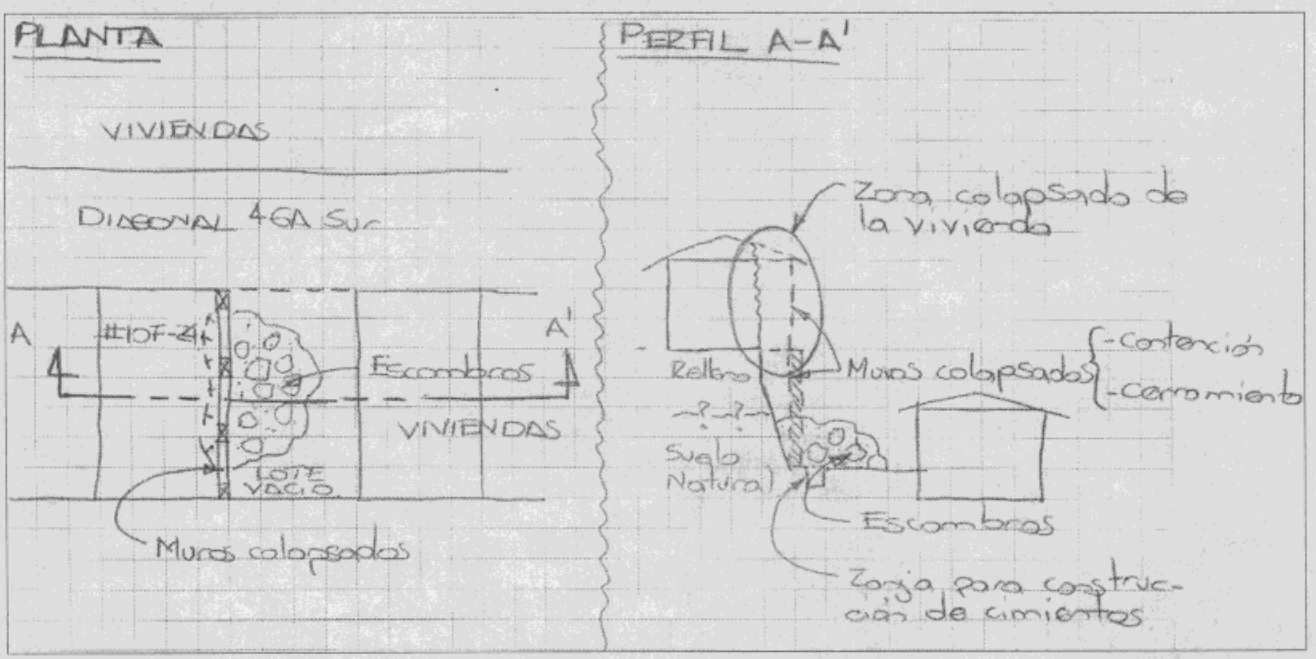

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Pedro Antonio Ruiz	Diagonal 46A Sur No. 10F - 24	5693551	5	3	2	Colapso parcial del costado sur de la vivienda, donde se encontraban las habitaciones.
2							
3							
4							
5							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Colapso del resto de la vivienda a raíz de la afectación que sufrieron los muros que quedaron en pie.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X		X	SI	NO
2								
3								
4								
5								

7 RECOMENDACIONES

- Evacuar Temporalmente la vivienda mientras el propietario realiza la reconstrucción de la misma.
- Realizar la reconstrucción de la vivienda por parte de los responsables del evento.
- Asistir con ayudas Humanitarias

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO
